

KOLAUDIM PER IIMPIANTE/
MAKINERI/PAISJE NGRITASE
E TRASPORTUESE

ÇERTIFIKATË INSPEKTIMI PER MAKINERI-PAISJE NGRITASE



QELLIMI I INSPEKTIMIT: ☐ Periodik 6 Mujor ☐ Periodik Vjetor ☐ Pas Riparimit ☒ Para Vënies në Punë

KODI / NUMRI I ÇERTIFIKATËS: FEV-PNG-VNK-241311

EMRI I KLIENTIT, NIPT, ADRESA	ADRESA E REALIZIMIT TE INSPEKTIMIT	VENDODHJA E PAISJES
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------

EDIL PROJECT SHPK
L57422001A

Lezhe Shengjin SHENGJIN Kune Shengjin
Lezhe, Rruga e Plazhit Kune, Kompleksi
Holiday In, Resort ne ndertim.

Ne Kantier Ndertimi

TE DHENAT E MAKINERI - PAISJES NGRITASE

NR. IDENTIFIKUES I PAISJES	PRONARI	DATA INSPEKTIMIT PARA ARDHES
----------------------------	---------	------------------------------

EDIL PROJECT SHPK

TIPI I PAISJES, PRODHUESI, MODELI	PROCEDURA INSPEKTIMIT, FLETA E PUNES SE KONTROLLIT, KODET PERKATESE	DATA INSPEKTIMIT
-----------------------------------	--	------------------

VINC KULLE
SIMMA GT118

FEV-PNG-VNK

13. 05. 2025

DATA E PRODHIMIT TE PAISJES	NGARKESA PUNES SWL (TON)	DATA E INSPEKTIMIT VIJUES
-----------------------------	--------------------------	---------------------------

1992-95

6 Max / 1.4 Min

13. 15. 2026

DETAJE TE PROVES ME NGARKESE NESE APLIKOHET

SWL ☐ SWL + 10% ☒ SWL + 25% ☐ SWL + 50% ☐ SWL + 100% ☐ _____ ☐ NA ☐

Tjeter, Percakto

REZULTATI NGA INSPEKTIMI I MAKINERI – PAISJES NGRITASE

GJENDJA TEKNIKE E PAISJES PER VIJIMESINE E OPERIMIT

☒ KONFORM


STANDARTI / LEGJISLACIONI:

☐ KONFORM ME SHENIME / DETYRA

Ligji 10489 dt.15/12/2011, VKM Nr.1062 dhe 1060 dt.23/12/2015, KTZ 238-81; ISBN 978 – 9928 – 01 – 012 - 4;
BS7121 pjesa 2, BS5744, BS449, BS466, BS456, BS2453, ISO4309, BS1290, BS2573 PJESA 1-2, BS302

SHENIME / DETYRA TEKNIKE

FOTO PERKATESE TE MAKINERI-PAISJES

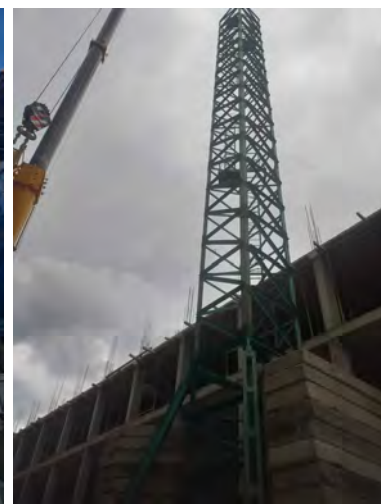

Vinçi eshte ne gjendje pune nga ana strukture dhe ajo mekanike e funksionimit.

Kjo Çertifikatë Inspektimi Shoqërohet me Raport Inspektimit në të cilin jepen udhëzimet rreth evidencave teknike që duhen përmirësuar.

Për: FEV sh.p.k.

Drejtues Teknik:
Ing. Kolaudator

Agim Zala





RAPORT INSPEKTIMI

VINÇ KULLE

		RAPORT INSPEKTIMI		CODE	
TIPI I INSPEKTIMIT		INSPEKTIM PAS MONTIMIT PARA VENIES NE PUNE		FEV - PNG -	
Inspektuar Nga:				Datë Inspektimi: _____	
Emër, Mbiemër, Firmë				Porositës:	
Prepared by / Pergatitur nga		Date / Date		Location / Vendodhja	
FUSION ENGINEERING VENTURE		TIRANE		Tirane	

PERMBAJTJA E RAPORTIT

TE PERGJITHSHME.....	1
GJENDJA TEKNIKE	1
PAJISJA E INSPEKTUAR	2
TABELA E KONTROLLEVE	2
KOMPONENTË TË PËRZIER TË MAKINERISË	2
BURIMI ENERGJTSE	3
SUPORTET	3
STRUKTURA.....	3
KONTROLLI DHE MANOVRIMI	4
FUNKSIONIMI I LEVIZJEVE NGRITASE	4
PAISJE/KOMPONENTE MEKANIK TE KAPJES DHE TE TJERA	4
FUNKSIONIMI I LEVIZJES DREJTVIZORE	5
FUNKSIONIMI I LEVIZJES RROTULLUESE	5
ELEMENTE TE TJERE LIDHUR ME MAKINERI/PAISJEN NGRITASE	5
SHENIME / KOMENTE SHITES RRETH INSPEKTIMIT	6
EVIDENCA ME FOTO	6

TE PERGJITHSHME

Marra në Përdorim e Vinçit Nga: _____

Muaji: **Maj**

Viti: **2025**

Adresa e Kantierit: **Shengjin, Lezhe**

Pronari Vinçit: **"Edil Project" Shpk**

GJENDJA TEKNIKE

- 
☒
- Gjendje Teknike e Pershtatshme per Perdorim
- ☒
- Gjendje Teknike me probleme, Vinci Ne Gjendje per tu Operuar por me detyra per permiresimin e gjendjes teknike sipas konstatimeve. Njoftohet Dr./Ing. Kantierit dhe Operatori, Te Plotesohen mangesite sipas Shenimeve Perkatase Te Konstatimit dhe te pasqyruara ne raportin teknik.
- ☐
- Gjendje Teknike Jo e Pershtatshme per Perdorim

Operatori Vinçit:

Emer, Mbiemer, Firma

Drejtori Teknik /
Inxhinieri Kantierit:

Emer, Mbiemer, Firma

		RAPORT INSPEKTIMI		CODE	
TIPI I INSPEKTIMIT		INSPEKTIM PAS MONTIMIT PARA VENIES NE PUNE		FEV - PNG -	
Inspektuar Nga:				Datë Inspektimi:	
Emër, mbiemër, firmë				Porositës	
Prepared by / <i>Pergatitur nga</i>		Date / <i>Date</i>		Location/ <i>Vendodhja</i>	
FUSION ENGINEERING				Place/ <i>Qyteti</i>	

PAJISJA E INSPEKTUAR

TIPI VINÇIT	Vinç Kullë	MODELI	GT118
PRODHUESI	SIMMA	NR. SERIAL	
VIT PRODHIMI	1992-95	DIAMETERI KAVOS	
LARTESIA (m)	46m	GJATESI KRAHU (m)	51m
SWL (TONS)	6/1.4	TIPI BAZAMENTIT	Mbitokesor me Betone

TABELA E KONTROLLEVE

NR.	U INSPEKTUA / KONTROLLUA	NIVELET TREGUES PER GJENDJEN TEKNIKE				
		1- Jo Funksionale; 2- Pranohet me komente; 3- Mjaftueshëm; 4- Mirë; 5- Shumë Mirë				
		N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
NR.	KOMPONENTË TË PËRZIER TË MAKINERISË					
01	Karrelit, Rrulat, Shinat / Udhëzueset?				X	
02	Rrotat, Bokullat, Spinotet, Pulexhot?				X	
03	Kabujt Elektrik?				X	
04	Kavot E Karrelit (Gërricje, Prerje, Përdredhje Etj.)?				X	
05	Kavot E Ngarkesës (Gërricje, Prerje, Përdredhje Etj.)?				X	
06	Pjeset E Nyjeve Mbërthyesë Të Kavove?				X	
07	Vinçi Është I Lubrifikuar Dhe U Kontrolluan Depozitat E Vajit?				X	
08	Shinat Udhëzuese Të Karrelit E Të Tjera lidhur me to?				X	
09	Suportet & Mbajteset E Kondrashesave?				X	

Operatori Vinçit: Emer, Mbiemer, Firma	Drejtori Teknik / Inxhinieri Kantierit: Emer, Mbiemer, Firma
--	--

		RAPORT INSPEKTIMI			CODE	
TIPI I INSPEKTIMIT		INSPEKTIM PAS MONTIMIT PARA VENIES NE PUNE			FEV - PNG -	
Inspektuar Nga:		Emër, mbiemër, firmë			Porositës	
Prepared by / <i>Pergatitur nga</i>		Date / <i>Date</i>		Location/ <i>Vendodhja</i>		Place/ <i>Qyteti</i>
FUSION ENGINEERING						
10	<i>Prixhonieret Ose Spinotet E Ankorimit?</i>				X	
11	<i>Bulonat E Spinotat e Kullës?</i>				X	
12	<i>Bulonat E Spinotat e Krahut?</i>				X	
13	<i>Korona Unazore, Rretulluese E Bigës Së Vinçit?</i>				X	
14	<i>Serbatoret e Vajisjes?</i>				X	
15	<i>Reduktoret?</i>				X	
Shto.:						
NR.	BURIMI ENERGITSE	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Kutia e shperndarjes se linjave elektrike?				X	
02	Paisjet edhe percjellesit?				X	
03	Mbrojtja e pjeseve te zhveshura qe permbajne tension?				X	
04	Gjendja Elektromotoreve?				X	
05	Mbrojtje Atmosferike [tokezimi]?				X	
Shto.:						
NR.	SUPORTET	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Shinat, Kabllot?				X	
02	Nyjet Fiksuese?				X	
03	Stopues Fundor?				X	
04	Hyrjet e Posatshme?				X	
Shto.:						
NR.	STRUKTURA	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Montimi I Pjeseve?				X	
02	Udhezuesa, Akse, pulexhot etj. ?				X	
03	Kondra Peshat?				X	
04	Vertikaliteti? <i>Rekomandohet Kontrolli Me Instrument</i>				X	
Shto.:						

Operatori
Vinçit:

Emer, Mbiemer, Firma

Drejtori Teknik /
Inxhinieri Kantierit:

Emer, Mbiemer, Firma

		RAPORT INSPEKTIMI		CODE		
TIPI I INSPEKTIMIT		INSPEKTIM PAS MONTIMIT PARA VENIES NE PUNE		FEV - PNG -		
Inspektuar Nga:		Emër, mbiemër, firmë		Porositës		
Prepared by / <i>Pergatitur nga</i>		Date / <i>Date</i>		Location/ <i>Vendodhja</i>		
FUSION ENGINEERING				Place/ <i>Qyteti</i>		
NR.	KONTROLLI DHE MANOVRIMI	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Kontrolli gjate perdorimit?				X	
02	Celesat ON/OFF?				X	
03	Ndalimi Emergjent?				X	
04	Sirena Emergjences / Akustike dhe Boria? <i>Duhet Rikontrolluar here pas here</i>					
Shto.:						
NR.	FUNKSIONIMI I LEVIZIEVE NGRITSE	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Mekanizmat?				X	
02	Sistemi Mbrojtjes Se Linjave Elektrike?				X	
03	Frenimi?				X	
04	Kontrolli Shpejtesise (Funksonimi Niveleve Te Shpejtesise) ?				X	
05	Sensori Limitit Te Siperme Te Ganxhes?				X	
06	Sensori I Limitit Te Poshtem Te Uljes?				X	
07	Sensori I Limitit Te Ngarkeses?				X	
Shto.:						
NR.	PAISJE/KOMPONENTE MEKANIK TE KAPJES DHE TE TJERA	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Bashkimet, Lidhjet?				X	
02	Pulexhot – Akset - Tamburot?				X	
03	Blloku I Ganxhes?				X	
04	Mjetet e tjera te kapjeve te ngarkeses?				X	
Shto.:						

Operatori
Vinçit:

Emer, Mbiemer, Firma

Drejtori Teknik /
Inxhinieri Kantierit:

Emer, Mbiemer, Firma

		RAPORT INSPEKTIMI		CODE		
TIPI I INSPEKTIMIT		INSPEKTIM PAS MONTIMIT PARA VENIES NE PUNE		FEV - PNG -		
Inspektuar Nga:		Emër, mbiemër, firmë		Porositës		
Prepared by / <i>Pergatitur nga</i>		Date / <i>Date</i>		Location/ <i>Vendodhja</i>		
FUSION ENGINEERING				Place/ <i>Qyteti</i>		
NR.	FUNKSIONIMI I LEVIZJES DREJTVIZORE	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Mekanizmat?				X	
02	Frenimi?				X	
03	Sensore e levizjes drejtevizore?				X	
04	Bllokuesit e levizjes ne rastet kur vinci nuk po perdoret?				X	
Shto.:						
NR.	FUNKSIONIMI I LEVIZJES RROTULLUESE	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Mekanizmat?				X	
02	Frenimi?				X	
03	Sensori I Levizjes Rrotulluese?				X	
04	Gjendja E Lire?				X	
Shto.:						
NR.	ELEMENTE TE TJERE LIDHUR ME MAKINERI/PAISJEN NGRITese	N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	N. 5
01	Ekrani Shfaqes se peshave ne paisje – N/A					
02	Instruksionet e Sigurise?					
03	Deklarimi I Instalimit(Montimit) Korrekt nga Instalatoret?					
04	Proces verbalet e marrjes ne dorezim te vincer nga perdoruesi sipas KTZ?					
05	Testet e Mbingarkeses / test para rifillimit?					
06	Pllaka Identifikimit te paisjes / Targeti Metalik I Fabrikimit?					
07	Çertifikatë Formimi Profesional Për Operatorin?					
Shto.:						

Operatori
Vinçit:

Emer, Mbiemer, Firma

Drejtori Teknik /
Inxhinieri Kantierit:

Emer, Mbiemer, Firma

		RAPORT INSPEKTIMI		CODE	
TIPI I INSPEKTIMIT		INSPEKTIM PAS MONTIMIT PARA VENIES NE PUNE		FEV - PNG -	
Inspektuar Nga:		Emër, mbiemër, firmë		Porositës	
Prepared by / Pergatitur nga		Date / Date		Location/Vendodhja	
FUSION ENGINEERING				Place/Qyteti	

SHENIME / KOMENTE SHITESE RRETH INSPEKTIMIT

Ne Pergjithesi gjendja teknike e Vincit eshte ne parametra normal dhe regjim i mire pune e funksionimi.

Duke qene se kantieri ku eshte instaluar ndodhet ne nje zone ku era eshte prezente dhe me norma mbi mesatare ne rekomandojme qe Vinci Ti nenshtrohet Kontrolleve Periodike me frekuence jo me shume se Cdo 2 Muaj (e preferueshme Cdo fillim muaji), kjo per arsye se kantieri ndodhet ne bregdet ku faktore te tjere si lageshtia dhe efektet e korrozionit qe jane prezent ne menyre permanente mund te ndikojne negativisht tek komponentet elektrik-elektronik si dhe tek ato mekanik qe si rrjedhoje cojne ne keq funksionim te tyre duke ndikuar dhe ne elemtet e sigurise se vincit gjate operimit ose jo.

Si elemnt shtese te sigurise rekomandohet te jene gjithmone prezent sensori i eres per te evituar operimin e vincit ne drejtim te kundert me eren si dhe ndalimin e punes me vinc kur era kalon limitet e rekomanduara.

EVIDENCA ME FOTO



Operatori Vinçit:		Drejtori Teknik / Inxhinieri Kantierit:	
<i>Emer, Mbiemer, Firma</i>		<i>Emer, Mbiemer, Firma</i>	
